

Befaring på Stavern barneskole 3 september 2024.


Universell utforming – eller mangel på.



HC toalett. Rullestol skal kunne komme under vasken med beina, uten å slå bort i veggen med fotbrett. Da kan det bli vanskelig å nå såpedispenseren, **som bør flyttes til veggen til venstre for vasken.**


SVAR FRA ENTREPRENØR: Er gjort i samråd med renhold, kan flyttes, men etterlater seg merker på vegg.

LK: Dette vil vi be om endring på.

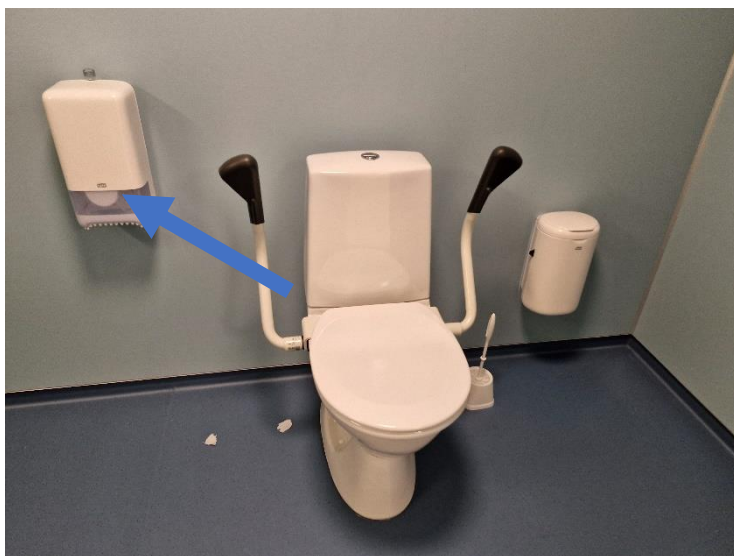

Avstand til toalettpapirholder . Ikke alle som kan å snu seg så mye at de når toalettpapiret som henger på veggen. Eller kan bruke høyre armen. Burde være toalettpapir på armlenet også.

SVAR FRA ENTREPRENØR: Endres

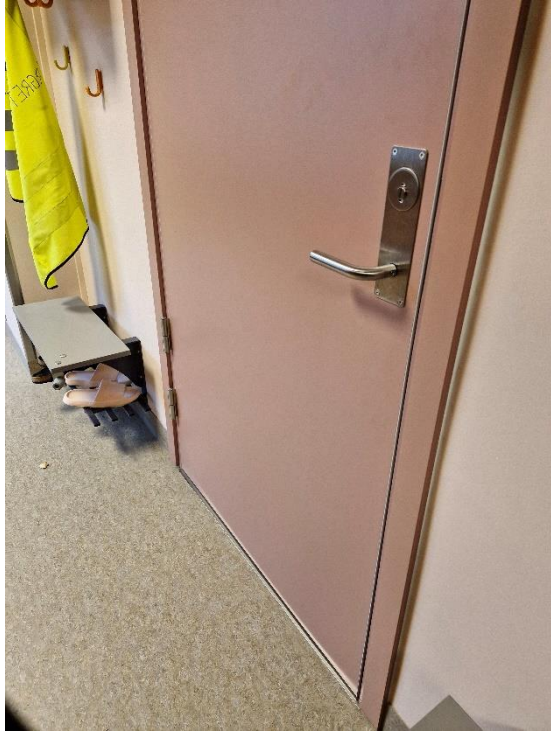

HC dør. Mangler døråpner. Er muligens ikke krav, men det burde vært lagt opp kabel, sånn at det ikke er så store kostnader å montere om det skulle bli behov.

*Svar fra entreprenør: Dette har ikke vært et tema, og er heller ikke et krav.
LK: Dette er svært kostnadsdrivende, og er av den grunn ikke vært et tema.*

HC toalett. Det manglet skråhåndtak på *innsiden av døra* på HC toaletta, slik at den blir lettere å lukke for en rullestolbruker.



Svar fra entreprenør: Dette vil ettermonteres



Knaggrekke.

Kan være vanskelig å nå for et barn i rullestol.

Svar fra entreprenør: Utført som prosjektert.

LK: Her vil vi se på tiltak på ender, om vi kan justere dette.

Her er det lagt inn terskeleliminator. Men ikke her.


Det bør være på alle terskler, og ikke vente med det til det «plutselig» kommer en elev i rullestol.

Svar fra entreprenør: Alle terskler er HC terskler som bygger ca. 23 mm.




Ledelinjer . Virker litt tilfeldig plassert. Noen steder er det flott, andre steder mangler de.

Her burde vel en blind (kåre Eriksen ?) prøve seg frem for å se hvor forståelig lederlinjene er.

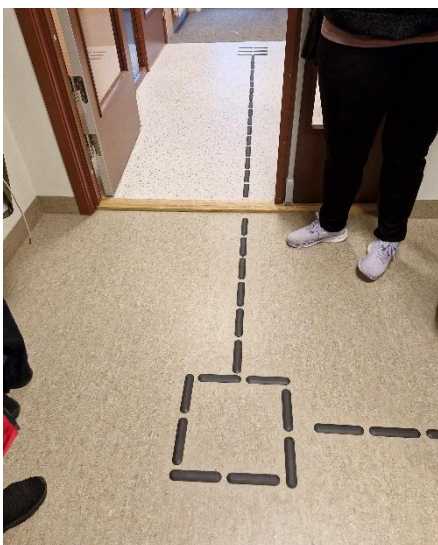

Svar fra entreprenør: Disse er utført som prosjektert, og leder frem til informasjonstavle innvendig.

LK: Vi kan ikke gå ut over lovkrav, men må vurderes særskilt om det kommer blinde/ svaksynte elever, ansatte eller foresatte ved skolen.

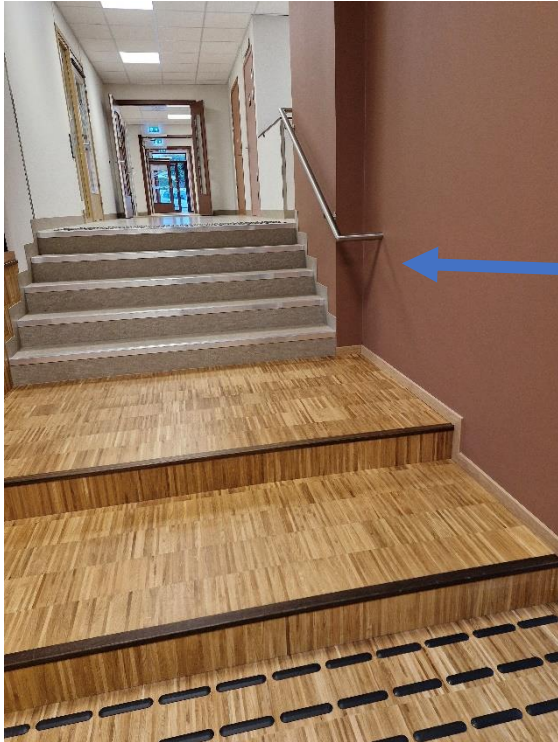

Trapp opp trapp ved heisen. 1 etg.
Mangler gelender nedre del av trapp.

Bør vel også markeres med «knotter» at her kommer det trinn.

Svar fra entreprenør: her er det fare- og oppmerksomhetsfelt i topp og bunn, der det henvises til er å anse som et trinn. Taktill merking kan monteres på bestilling. Håndløper kan monteres om ønskelig

LK: Vi har bedt om håndløper

For kort gelender ved trapp på

uteområdet ved inngangen til skolen. Det må også settes på markering på øverste trappetrinn som varsel om at det kommer trapp.. *Svar fra entreprenør:*

Utført som prosjektert, iht gjeldende lovverk.



Skilt ved hovedinngang.

Mangler taktill skrift/ pil . Umulig for en svaksynt å vite hvilken vei han skal gå.

Svar fra entreprenør: Kan utføres om ønskelig

LK: Vi ønsker dette



Skolekjøkken.


For sent å gjøre noe med nå kanskje . Men en av stekeovnene i delen som er tilrettelagt med hev og senk kjøkkenbenk burde ha sidehengslet dør. Som en kan se på bildet, er det vanskelig å ta ut ett varmt brett med vanlig stekeovnsdør om en sitter i rullestol. Men vi synes det er flott at det

er montert hev og senk benk, så både elever som ikke er så høye og rullestolbrukere får glede av matlaging.



Lyse og fine klasserommet.

Lyddempet, og med mulighet til å trekke seg tilbake i egen «hule» om en elev trenger ro.

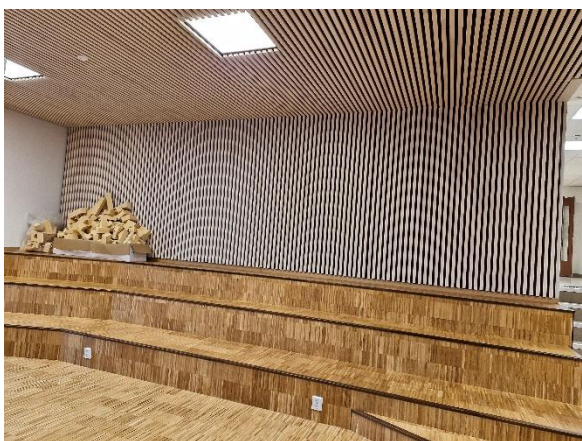

Her er det blitt lovet at den stripete og urolige veggen skal males. Dette håper vi skjer raskt, vi ble nesten uvele av å se på veggen.

Svar fra entreprenør: Som prosjektert
LK: Enige med rådet, det er noe vi forsøker å få gjort noe med.

- Hovedinngangen var vanskelig å finne. Den bør skiltes tydelig ved inngang til skolen. *Svar fra entreprenør: Skiltet som prosjektert*
- HC parkering manglet. Må tydelig merkes, ikke bare på bakken, da det blir borte når det ligger snø. *Svar fra LK: HC parkering skal merkes opp.*
- Ledelinje inn fra uteområdet. *Svar fra LK: Vi vil se på dette*

