


## Svinvika - status



# Svinvika - status



Larvik  
kommune

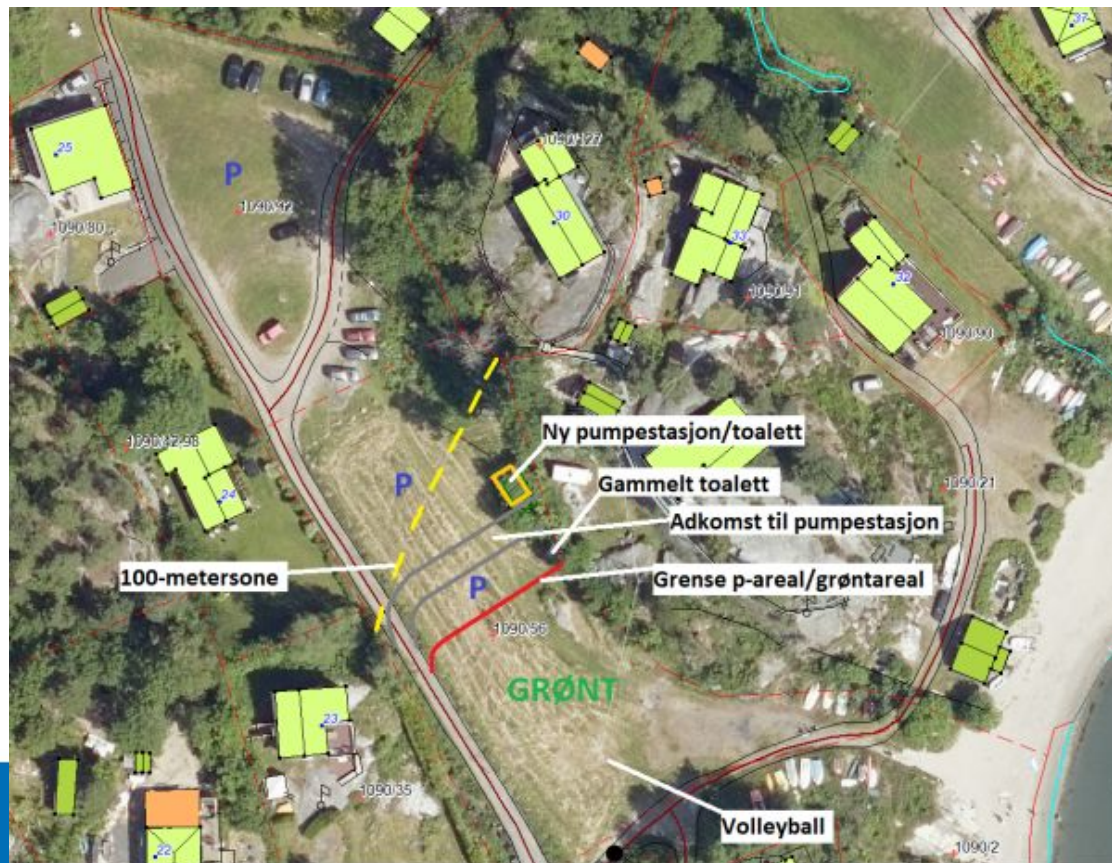

Oversikten viser planlagt tilstand, før eventuelle endringer som følge av klagesaken.



## Saken ble behandlet i planutvalget 23.08

### **PLA- 159/22 Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen legger fram fordeler og ulemper med alternativ plassering av pumpestasjon og toalettanlegg som bedre ivaretar siktlinjen mot sjøen. Det vurderes å halvere antall parkeringsplasser slik at det blir mulighet for ballspill i området mot stranda.

Vi har hatt et internt møte man 29.08 hvor vi ble enige om å foreslå følgende:

Pumpestasjon og toalettanlegg foreslås plassert som tidligere.  
Parkeringsplass utvides ikke.  
Overvannsledning forlenges.



**Larvik  
kommune**

## Plassering av pumpestasjonen:

Flere mulige alternativer vurdert, men forkastet pga:

- nærhet til stranda
- på grønt lekeområde
- inntil grusvei
- nærhet til hytter

Foreslått plassering tar hensyn til:

- eiendomsgrenser i området
- trafikksikkerheten både i forhold til p-plassen og snuareal for sugebilen
- avstand til toalett

Utarbeidet forslag har tatt hensyn til dette.



Larvik  
kommune

### *Selvfall/pumping*

- valgt plassering gjør at hyttene i nærheten kan ha selvfall mot kommunalt avløpsnett
- skal stasjonen flyttes lenger nordover, vil flere av hyttene bli pålagt å montere private pumpestasjoner



**Larvik  
kommune**

### *Oversiktlig adkomst og snuareal*

- spylebilen må ha mulighet til å snu i tilknytning til pumpestasjonen
- valgt plassering gjør at spylebilen kan snu uten å måtte rygge

### *Offentlig HC toalett*

- Kommunalteknisk plan: "Utskifting/etablering av offentlige toaletter skal vurderes ved rehabilitering/nybygg av avløpspumpestasjoner
- sambygging meds pumpestasjoner mer kostnadseffektivt
- dagens utedo 80m fra stranda, nytt toalett/pumpestasjon 90m
- toalett bør ikke ligge lenger fra stranda enn dette

## Overvannsledningen



Larvik  
kommune

- hovedoppgaven er å samle overflatevann fra veisluk og andre kilder og lede til resipient
- vil også kunne fungere som nødoverløp for pumpestasjonen
- hvis nødoverløpet ikke kobles til overvannsledningen kommer avløpet ut av stasjonen og på bakken (da blir området stengt i 6-8 uker til bakteriene dør)

Moderne pumpestasjoner som denne forventes ikke å gå i overløp. Har i tillegg en buffertank som vil fylles før den går i nødoverløp. Saltvann regnes som den beste resipienten grunnet god fortynningsevne og selvrensingsevne. Ved å forlenge sjøledningen vil det bli ankringsforbud langs ledningen.

## Parkeringsplass

Bestilling av utvidet parkeringsplass ble gjort med bakgrunn i KST -vedtak i sak 157/20 - Kyststi Tjølling - trasevalg:



Larvik  
kommune

*For å få et bedre utgangspunkt for en fremtidig sammenhengende kyststi, som er så nær kysten som mulig, starter Larvik kommune med først å tilrettelegge for flere tilgjengelige parkeringsplasser i tilknytting til eksisterende populære turstier.*

13.08.21 - delegert vedtak 1113/21 - av saken fremgår:



**Larvik  
kommune**

*Alle berørte parter/eiere av husstander og grunneiere er varslet om prosjektet gjennom felles vellagsinformasjon og informasjon/varsel og oppgradering av private stikkledninger.*

04.03.22 - delegert vedtak 347/22:

*Larvik kommune tar innkomne klager/merknader til følge og opphever rammetillatelsen av 13.08.21 så langt gjelder pumpestasjon m/overbygg, parkeringsplass og nødoverløpsledning. Tillatelsen, innkludert påfølgende igangssettingstillatelse, opprettholdes for VA-traseen for øvrig.*

Søkt på nytt, gitt tillatelse påklaget, klagesak i PU 23.08, sak 159/22, der er vi nu
